

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

18 MAG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' **18 MAG. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO - DONATO - LUCISANO - META - PIZZUTELLI

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 2630

OGGETTO: L.R. 74/89 - Comune di San Lorenzo Nuovo (Rm) -
Eliminazione barriere architettoniche nel complesso scolastico e
locale pluriuso sito nel Capoluogo. Determinazione quota
definitiva contributo regionale e saldo - cap. 45192 - L.
23.377.669 - es. fin. 1999 imp. 22235.



L.R. 74/89 - Comune di S. LORENZO NUOVO (VT) - Eliminazione barriere architettoniche nel Complesso scolastico e locale pluriuso sito nel Capoluogo - Determinazione quota definitiva contributo regionale e saldo -
Cap. 45192 - £. 23.377.669 - Esercizio finanziario 1999 -

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTE le leggi regionali 13 aprile 1977 n° 15 e 6 aprile 1985;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 26.6.1980 n° 88;

VISTA la legge 15 maggio 1997 n° 127;

VISTA la legge regionale 4.12.1989 n° 74, concernente "interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi";

VISTA la Deliberazione di ripartizione di contributi del 29.12.1993 n° 12121 come modificata con Deliberazione del 10.10.1995 n° 8265 con la quale la G.R. ha attribuito al Comune di S. LORENZO NUOVO (VT) la somma di £. 77.000.000 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel Complesso scolastico e locale pluriuso sito nel Capoluogo;

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore del 9.11.1995 n° 201/95 con il quale è stato formalmente concesso al Comune di S. LORENZO NUOVO (VT), a seguito della presentazione della documentazione di cui all'art. 7 della citata legge 74/89, il contributo di £. 77.000.000 per l'esecuzione dei lavori suddetti;

CONSIDERATO

- che ai sensi della legge regionale del 6.4.1985 n° 33 e sue successive integrazioni e modifiche è stata erogata al Comune di S. LORENZO NUOVO (VT) la somma di £. 46.200.000 pari al 60% del contributo concesso con la citata Deliberazione;

- che per il residuo impegno di spesa, è intervenuta la perenzione amministrativa ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 33 e dell'art. 34 (1° comma) della L.R. 12.4.1977, n° 15;

VISTE le istanze del Comune di S. LORENZO NUOVO del 31.7.1998 n° 3653 e del 2.12.1998 n° 5533 intese ad ottenere il saldo del contributo concesso;

VISTA la Deliberazione del 31.12.1997 n° 366 con la quale la G. C. ha approvato lo stato finale ed i certificati di regolare esecuzione dei lavori suddetti;

VISTA la Deliberazione del 6.6.1998 n° 130 con la quale la G. C. ha approvato il rendiconto delle spese sostenute determinando in £. 76.992.105 la spesa complessivamente occorsa per l'intervento in oggetto come di seguito specificata:

per lavori	£.	59.991.033
per IVA su lavori	£.	2.399.641
per spese tecniche	£.	12.029.520
per IVA su spese tecniche	£.	2.331.321
per CNPAIA	£.	<u>240.590</u>
Totale	£.	<u><u>76.992.105</u></u>

CONSIDERATO

- che nella suddetta Deliberazione 130/98 risultano liquidate spese non ammissibili a contributo regionale in quanto relative ad obbligazione giuridica non formalizzata nei tempi dovuti (anteriore alla data del 31.12.1995) essendo conseguenti a perizia di variante approvata con D.G.C. del 7.6.1997 n° 201;

ATTESO, per quanto sopra, che l'importo massimo riconoscibile a contributo regionale ammonta a complessive £. 69.577.669 come di seguito specificato:



per lavori	£.	57.564.682 (importo originario al netto del ribasso d'asta)
per IVA su lavori	£.	2.302.587
per spese tecniche	£.	8.000.000 (importo originario)
per IVA spese tecniche	£.	1.550.400
per CNPAIA	£.	<u>160.000</u>

VISTO il D. P. G. R. del 7.11.1996 n° 2086 di ricognizione dei residui perenti, nei quali, tra gli altri, è compreso il Comune di S. LORENZO NUOVO (VT) per l'intervento in oggetto;

DELIBERA

- 1) di determinare in £. 69.577.669 la spesa ammissibile a finanziamento regionale per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche nel Complesso Scolastico e locale pluriuso sito nel Capoluogo del Comune di S. LORENZO NUOVO (VT) e, sulla base degli acconti già erogati, in £. 23.377.669 l'importo da corrispondere a saldo dei lavori sopracitati;
- 2) di autorizzare l'impegno del suddetto importo di £. 23.377.669 sul cap. 45192 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1999;
- 3) di autorizzare il pagamento della predetta somma di £. 23.377.669 in favore del Comune di S. LORENZO NUOVO (VT) per il titolo descritto in narrativa;
- 4) di accertare l'economia di £. 7.422.331 nei confronti del contributo concesso di £. 77.000.000;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n°127.

10 GIU. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE





COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO

Provincia di Viterbo

Cod. Fisc e Part IVA 00238480560

Piazza Europa 31 Tel. 0763/77391-2
Fax 0763/77611

per copia

Prot. 3653

San Lorenzo Nuovo, li 31/07/1998

Spett.le REGIONE LAZIO
Ass.to OPERE e RETI di
SERVIZI e MOBILITA'
SETTORE 36 UFFICIO 3°
via Capitan Bavastro, 108
00154 ROMA

Oggetto : **L.R. 4.12.1989 n°74 - Eliminazione barriere architettoniche nel plesso scolastico e locule plurisno capoluogo.**
Deliberazione G.R. del 10/10/1995 n° 8265 (Modifica nella D.G.R. del 29/12/1993 n° 12121) - **Contributo di lire 77.000.000**

M. Sci
Arch. Documenti
16/11/98

Il sottoscritto **Andreucci Carlo**, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Lorenzo Nuovo (VT) con sede in P.zza Europa, 31.

INVIA

ad integrazione della richiesta di saldo del contributo e successiva integrazione, trasmesse rispettivamente con nota prot. 656 del 23/01/1998 e nota prot. 1707 del 01/04/1998, le seguenti documentazioni:

1. *156* Delibera di Giunta Municipale n. 166 del 30/03/1996 con oggetto: "Anticipo prezzo d'appalto Ditta Rocchi Aldo";
2. Delibera di Giunta Municipale n. 130 del 6/6/1998 con oggetto: "Revoche delibera di G.C. 367/97 - 22/98 e 74/98";
3. Consuntivo lavori ditta Ricci Giuseppe;
4. Documentazione fotografica;

Distinti Saluti

ASSEMBLATO OPERE E RETI
11/08/1998
34/1/36

comuni
ok
12-10

IL SINDACO
ANDREUCCI Carlo



16.8
verif. in u. del. 16.8



COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO

Provincia di Viterbo

Cod. Fisc e Part. IVA 00238480560

Piazza Europa 31 Tel. 0763/77391-2
Fax 0763/77611

Prot. 5533

San Lorenzo Nuovo, li 2/12/1998

Rif. Vs. nota 4277 del 12/10/1998

Spett.le REGIONE LAZIO
Ass.to OPERE e RETI di
SERVIZI e MOBILITA'
SETTORE 36 UFFICIO 3°
via Capitan Bavastro, 108
00154 ROMA

Oggetto : **L.R. 4.12.1989 n°74 - Eliminazione barriere architettoniche nel plesso scolastico e locale pluriuso capoluogo.**
Deliberazione G.R. del 10/10/1995 n° 8265 (Modifica nella D.G.R. del 29/12/1993 n° 12121) - Contributo di lire 77.000.000

Il sottoscritto **Andreucci Carlo**, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Lorenzo Nuovo (VI) con sede in P.zza Europa, 31,

INVIA

ad integrazione della richiesta di saldo del contributo e successive integrazioni, trasmesse rispettivamente con nota prot. 656 del 23/01/1998, nota prot. 1707 del 01/04/1998 e nota prot. 3653 del 31/07/1998 la seguente documentazione:

I. Documentazione fotografica richiesta;

Distinti Saluti

REGIONE LAZIO	UFFICIO 3°
OPERE E RETI	SERVIZI E MOBILITA'
11 GEN 1999	
Prot. 51	

IL SINDACO
ANDREUCCI Carlo



8760000000 13.1
ok



ORIGINALE

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO
(prov. di Viterbo)

Comune di S. Lorenzo Nuovo
(PROVINCIA DI VITERBO)

P.C.C. ALL'ORIGINALE PER USO
AMMINISTRATIVO

SAN LORENZO, il 31/07/1998
IL SEGRETARIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

deliberazione n. 130

del 6/6/1998



OGGETTO: Rendicontazione L.R. 74/89 - Revocche Delibere di G.C. 367/97
22/98 e 74/98.

L'anno 98 il di sei del mese di giugno alle ore 13
della solita sala delle adunanze del Palazzo Municipale, previo
osservanza di tutte le formalità previste per legge, si è riunita la
Giunta Municipale.

All'appello, i componenti della Giunta:

IL SINDACO PRESIDENTE ANDREUCCI CARLO

L'ASSESSORE DEL SIGNORE BENEDETTO

L'ASSESSORE MINCINI LUCIANO

risulta

Presiede l'adunanza il Sindaco ANDREUCCI CARLO

Assiste il Segretario Comunale Dr. COLONNELLI Franco
incaricato del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla
trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che delibera n.258 del 31/5/1995 della G.M., esecutiva, è stato approvato il progetto relativo alla Eliminazione Barriere Architettoniche Scuola Materna Elementare e Media per un importo complessivo di €.77.000.000 di cui €.61.075.480 a base d'asta e €.15.624.520 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che l'opera è finanziata con Contributo Regionale L.R.74/89;

che con delibera della G.M. n.465 del 9/12/1995 è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto all'Impresa Aldo ROCCHI di Ischia di Castro a seguito di gara di licitazione privata tenutasi il 4/12/1995 per la somma di €.57.564.682;

che con contratto repertorio 139/95 sono stati affidati all'Impresa ROCCHI Aldo di Ischia di Castro i lavori di Eliminazione Barriere Architettoniche Scuola Materna, Elementare e Media, per un importo netto del ribasso d'asta di €.57.564.682;

che i lavori hanno avuto inizio in data 19/12/1995;

Che con delibera di G.M. n.146 del 30/3/96 è stata concessa ed erogata alla Ditta appaltatrice l'anticipazione sull'importo contrattuale pari a €.5.756.468 oltre IVA 4%;

che con delibera di G.M. n.418 del 7/12/1996 è stato approvato il I SAL per un importo di €.30.848.436 e liquidato il I certificato di pagamento per un importo di €.26.085.967 oltre IVA 4%;

che durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva per adeguamento delle aree esterne degli edifici scolastici alle strutture circostanti realizzate ed in corso di costruzione (area esterna palestra ecc.);

che è stata approvata la perizia di variante con delibera n.201 del 7/5/97 di G.M. per un importo lavori pari a €.59.991.633 e €.17.008.367 per somme a disposizione;

che con delibera di G.M. n.321 del 10/11/97 è stato approvato il II SAL per un importo di €.57.028.659 e liquidato il II certificato di pagamento per un importo di €.17.897.265 oltre IVA 4%;

che con delibera n.321 è stato approvato il 2° SAL;

che l'Impresa ROCCHI Aldo di Ischia di Castro con nota del 10/10/97 dichiarava la propria indisponibilità ad effettuare i lavori di completamento relativi alla Eliminazione Barriere Architettoniche nelle scuole medie, elementari e materna (contratto Rep.139/95 e alle di sottoriscossione del 28/4/1997);

che in particolare una parte dei lavori non-sous-traiti realizzati dall'Impresa e eseguiti in maniera conforme e pertanto non contabilizzati dalla Direzione dei Lavori;

che all'uopo è stata redatta una 2° perizia di variante da parte dell'Ing. Raffaele Varo per definire e contabilizzare i lavori realizzati dall'Impresa ROCCHI Aldo oltre alle perizie di stima per lavori da affidare dall'Ente d'Ufficio ed in economia con il sistema del continuo fiduciario per completare l'opera;

che pertanto è stata approvata la 2° perizia di variante di cui sopra e si è proceduto all'affidamento dei lavori d'ufficio come sopra esposto alla Impresa RICCI Giuseppe di Montefiascone, giusta delibera n.322 del 10/11/1997 ai sensi dell'art.341 Legge 20/03/1865 all. 6. n.2248 ed ai sensi dell'art.74 R.D. 350/1895 per un importo di €.7.962.374 oltre IVA 4% quale differenza tra importo dei lavori della perizia di variante e l'importo del 2° SAL;



Che con delibera n. 319 di G.M. del 19/12/1997 è stato approvato il
 consuntivo dei lavori dell'Impresa RICCI Giuseppe di Montefiascone per
 l'importo di f. 7.962.374 e liquidato il pagamento della somma di
 f. 442.014,80 oltre IVA 4% al netto delle ritenute di garanzia;
 che con delibera di G.M. n. 366/97, è stato approvato lo Stato
 finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione per un importo lavori
 di f. 202.659 per quanto riguarda la Ditta ROCCHI Aldo;
 che con stessa delibera di G.M. è stata liquidata alla Ditta ROCCHI
 Aldo di Ischia di Castro la somma per ritenute di garanzia pari a
 f. 307.974 oltre IVA 4% ed è stata liquidata alla Ditta RICCI
 Giuseppe di Montefiascone la somma di f. 437.931 oltre IVA 4% quale
 parte in garanzia;
 che per quanto concerne le Parcelle Tecniche si è provveduto alla
 liquidazione con i seguenti atti deliberativi:
 - con progetto f. 6.005.840 oltre CNPAIA 2% e IVA (Delibera
 n. 105 del 22/3/1997);
 - con progetto f. 3.256.614 oltre CPAIA 2% ed IVA
 (Delibera n. 367 del 3/12/1997);
 che occorre provvedere alla rendicontazione dei lavori;
 che i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi;
 sono unanimi.

D E L I B E R A

approvare le delibere di G.M. n. 367/97-22/98 e 74/98;
 rendicontare i lavori di cui in premessa dando atto che il
 consuntivo finale delle opere è il seguente:
 Compres. Impr. RICCI G. e ROCCHI A.

59.991.033
2.399.641
12.029.520
2.331.321
240.590
76.992.105

Si invia copia del presente atto, insieme ai documenti
 relativi alla Pedana Azie Ats to Opere Reti e Mobilità per
 la liquidazione a saldo del contributo concesso ai sensi della
 legge n. 30 del 28/2/1997, al presente atto immediatamente esecutivo.



Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 8/6/90, n.142.

IL FUNZIONARIO Resp. del servizio
IL FUNZIONARIO Resp. serv. ragioneria
IL SEGRETARIO COLONNELLI DR. FRANCO
ZANONI Paola

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to ANDREUCCI CARLO

IL SEGRETARIO
F.to FRANCO COLONNELLI

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55 comma 5 della legge 8/6/90, n.142

3 copie conforme all'originale
II.



IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
RAG. ZANONI PAOLA

IL SEGRETARIO
DR. FRANCO COLONNELLI

2 LUG. 1998 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

II. 2 LUG. 1998

3092
ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO
DR. FRANCO COLONNELLI

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il 10-7-98

non essendo pervenute richieste di invio a controllo, per essendo soggetta a controllo, in quanto inerente esecutiva di altra deliberazione.

IL SEGRETARIO

INVIO AL C.R.C.

La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo:

non essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art.45, comma 1 della legge 8/6/90, n.142.

IL SEGRETARIO

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
per la decorrenza dei termini di cui all'art.46, comma 1, della legge 8/6/90, n.142, in data
per l'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del
prob.

IL SEGRETARIO



COMUNE DI
SAN LORENZO NUOVO
Provincia di VITERBO

Comune di S. Lorenzo Nuovo
P.C.C. ALLO UGUALE PER USO
AMMINISTRATIVO
SAN LORENZO il 23.12.1997
REGOLARE COMUNALE



INTERVENTO ESECUTIVO COMUNALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE

Impresa: RICCI GIUSEPPE

Affidamento con Cottimo fiduciario approvato con Delibera n° 322 del 10.11.1997

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 1997 il giorno 19 del mese di Dicembre il sottoscritto Dott. Ing. Alvaro Raffo nella sua qualità di Direttore dei Lavori all'uopo incaricato dal Comune di San Lorenzo Nuovo (VT).

- Visto l'art 116 del Regolamento per la Direzione, la contabilizzazione e la collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D. 25/05/1985, n. 350 e successive modifiche;
- Considerato che il giorno 19.12.1997 è stato effettuato un sopralluogo alla presenza dell'impresa dal quale è emerso che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali in conformità del progetto approvato e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione; che tutte le singole categorie di lavoro eseguite corrispondono in tutto e per tutto al consuntivo redatto dal sottoscritto;





- che nella contabilizzazione dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di preventivo;
- che in base alla revisione tecnico-contabile, integralmente eseguita, si e' confermato l'importo dello stato finale in nette £. 7.962.373 .

CERTIFICA

che i lavori di completamento INTERVENTO ESECUTIVO COMUNALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE (opere di completamento non eseguite dall'impresa Rocchi Aldo esecutrice dei lavori di cui al contratto Rep. n° 139 del 19.12.1995) sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa RICCI Giuseppe e liquidati per l'importo di nette £. 7.962.373 (diconsi lire settemilioninovecentosessantaduemilatrecentosettantatre).

San Lorenzo Nuovo li 12/12/97

L'IMPRESA: RICCI GIUSEPPE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Alvaro BAFFO



COMUNE DI
SAN LORENZO NUOVO
Provincia di VITERBO

INTERVENTO ESECUTIVO COMUNALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE - SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE

IMPRESA: ROCCHI ALDO

Contratto in data : 19.12.1995 REP. N. 139

Comune di S. Lorenzo Nuovo
PROVINCIA DI VITERBO
P.C.C. ALL'ORIGINALE PER USO
AMMINISTRATIVO
SAN LORENZO NUOVO
19.12.1997

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 1997 il giorno 19 del mese di Dicembre il sottoscritto Dott. Ing. Alvaro Baffo nella sua qualità di Direttore dei Lavori all'uopo incaricato dal Comune di San Lorenzo Nuovo (VT).

- Visto l'art 116 del Regolamento per la Direzione, la contabilizzazione e la collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D. 25/05/1985, n. 350 e successive modifiche;
- Vista la propria relazione sul conto finale che si ritiene totalmente trasferita e facente parte integrante del presente atto;
- Considerato che il giorno 19.12.1997 è stato effettuato un sopralluogo alla presenza dell'impresa dal quale e' emerso che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali in conformita' del progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali nella Direzione dei Lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione; che tutte le singole categorie di lavoro eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;




- che nella contabilizzazione dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto;

- che in base alla revisione tecnico-contabile, integralmente eseguita, si e' confermato l'importo dello stato finale in nette £. 52.028.659.

CERTIFICA

che i lavori di INTERVENTO ESECUTIVO COMUNALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE -SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa ROCCHI ALDO e ne liquida l'importo in nette £. 52.028.659 (diconsi lire Cinquantaduemilioni ventottomila seicentocinquantanove) da cui, detratto l'acconto corrisposto per complessive £. 49.720.685 (diconsi lire quarantanovemilionsettecentoventimila-seicentoottantacinque) resta il credito netto dell'impresa di £. 2.307.974 (diconsi lire duemilionitrecentosettemilanovecentosettantaquattro).


San Lorenzo Nuovo li 19/12/92

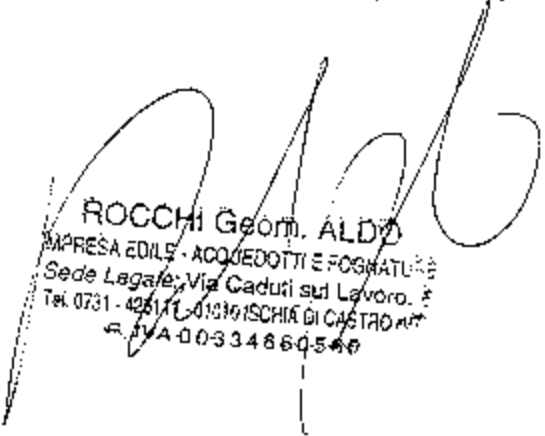
ROCCHI Geom. ALDO
IMPRESA EDILE - ACQUEDOTTI E FOGNATURE
Sede Legale: Via Caduti sul Lavoro, 5
Tel. 0731 - 426171 - 0103161SCHIA DI CASTRO
R.I.V.A. 00934860549

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Alvaro BAFFO





ORIGINALE

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO
(prov. di Viterbo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Sessione n. 366 del 31/12/1997

Comune di S. Lorenzo Nuovo
(PROVINCIA DI VITERBO)
P.C.C. ALL'ORIGINALE PER USO
AMMINISTRATIVO
SAN LORENZO, IL 23 OTT 1998
IL SEGRETARIO COMUNALE

C.R.E. L.R. 74/89.



[Handwritten signature]

Il giorno 31 del mese di Dicembre alle ore 12:00
nella solita sala delle adunanze del Palazzo Municipale, previo
adempimento di tutte le formalità previste per legge, si è riunita la
Giunta Municipale.

Partecipano i componenti della Giunta:

- IL SINDACO PRESIDENTE: ANDREUCCI CARLO
- L'ASSESSORE DEL SIGNORE BENEDETTO
- L'ASSESSORE MENCINI LUCIANO



Adunanza il Sindaco ANDREUCCI CARLO

Il Segretario Comunale Dr. COLONNELLI Franco
ha presieduto verbale.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, numero degli intervenuti si passa alla
discussione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con delibera n.236 del 31/5/1995 della G.M., esecutiva, è stato approvato il progetto relativo Eliminazione Barriere Architettoniche Scuola Materna Elementare e Medie per un importo complessivo di £.77.000.000 di cui £.61.575.490 a base d'asta e £.15.424.520 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che l'opera è finanziata con Contributo Regionale L.R.74/89;

che con delibera della G.M.n.445 del 9/12/1995 è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto all'Impresa Aldo ROCCHI di Ischia di Castro a seguito di gara di licitazione privata tenutasi il 4/12/1995 per la somma di £.57.564.682;

che con contratto repertorio 139/95 sono stati affidati all'Impresa ROCCHI Aldo di Ischia di Castro i lavori di Eliminazione Barriere Architettoniche Scuola Materna, Elementari e Medie, per un importo al netto del ribasso d'asta di £.57.564.682;

che i lavori hanno avuto inizio in data 19/12/1995;

che con delibera di G.M. n.418 del 7/12/1996 è stato approvato il 1 SAL;

che durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva per adeguamento delle aree esterne degli edifici scolastici alle strutture circostanti realizzate ed in corso di costruzione (area esterna palestra ecc.) ;

che è stata approvata la perizia di variante con delibera n.201 del 7/6/97 di G.M.;

che con delibera n.321 è stato liquidato il 2° SAL;

che l'Impresa ROCCHI Aldo di Ischia di Castro con nota del 20/10/1997 dichiarava la propria indisponibilità ad effettuare i lavori di completamento relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole medie, elementari e materne(Contratto Rep. 139/95 e atto di sottomissione del 26/04/1997)

che in particolare una parte dei lavori non sono stati realizzati dall'impresa o eseguiti in maniera conforme e pertanto non contabilizzati dalla Direzione Lavori;

che all'uopo è stata redatta una 2° perizia di variante da parte dell'Ing. BAFFO Alvaro per definire e contabilizzare i lavori realizzati dall'Impresa ROCCHI ALDO oltre alla perizia di stima per lavori da affidare in economia con il sistema del cottimo fiduciario per completare l'opera in questione;

che con delibera di G.M.n.322 del 10/11/1997 è stata approvata la 2° perizia di variante ed è stata approvata l'esecuzione di opere in economia con il sistema del cottimo fiduciario affidando i lavori da eseguire alla Ditta RICCI Giuseppe di Montefiascone sotto la direzione dei lavori dell'Ing. BAFFO Alvaro;

che è stato formalizzato l'affidamento dei lavori alla Ditta: RICCI Giuseppe di Montefiascone con contratto di cottimo fiduciario Rep. n. 187 del 19/12/1997

che la Ditta Ricci Giuseppe di Montefiascone, ha completato i lavori;

che con delibera di G.M. n.359/97 è stato approvato il consuntivo dei lavori ed è stata disposta la relativa liquidazione al netto delle ritenute di garanzia per un importo di £.7.524.442 oltre IVA 4%;

Che l'Ing. Baffo Alvaro ha prodotto gli atti contabili relativo allo Stato Finale dei lavori di cui al contratto Rep.139/75 eseguiti, dalla Ditta Rocchi Aldo di Ischia di Castro per un importo di £.52.028.659



al netto dell'IVA di Legge oltre al Certificato di Regolare Esecuzione
dei lavori di cui al contratto di cottimo fiduciario
Rep. 187/97, eseguiti dalla Ditta Ricci Giuseppe di Montefiascone per un
importo di f. 7.962.373 oltre IVA di Legge;

Visti gli atti contabili sopra descritti;

Che occorre procedere alla relativa approvazione;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

Di approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale
comprensivi del C.R.E. dei lavori di eliminazione barriere
Architettoniche Scuole eseguiti dalla Ditta Rocchi Aldo di Ischia di
Castro, per un importo di f. 52.028.659;

Di liquidare alla Ditta Rocchi Aldo di Ischia di Castro la somma di
f. 2.307.974 oltre IVA 4%;

Di approvare il C.R.E. dei lavori di completamento di Eliminazione
barriere Architettoniche scuole non eseguite dalla Ditta Rocchi Aldo
di Ischia di Castro ed affidati con contratto di cottimo fiduciario
Rep. 187/97 alla Ditta RICCI Giuseppe di Montefiascone per un importo
lavori di f. 7.962.373;

Di liquidare alla Ditta RICCI Giuseppe di Montefiascone la somma di
f. 437.931 oltre IVA 4% e di provvedere ad emettere mandato di
pagamento dopo avere acquisito le note di regolarità contributiva ed
assicurativa;

Di imputare la spesa complessiva pari a f. 2.745.905. (2.307.974 +
437.931) oltre IVA 4% al Cap. 11671 RR.PP.;

Di svincolare la polizza fidejussoria a garanzia dell'esatto
completamento dei lavori;

Di procedere con la rendicontazione dei lavori per richiedere il
saldo del contributo alla Regione Lazio;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di



Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico contabile nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 8/6/90, n.142.

IL FUNZIONARIO
Resp. del servizio

IL FUNZIONARIO
Resp. serv. ragioneria
ZANONI Paola

IL SEGRETARIO
COLONNELLI Dr. FRANCO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to ANDRECCI CARLO

IL SEGRETARIO
f.to FRANCO COLONNELLI

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55 comma 5 L.8.6.90, n.142

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
RAG. ZANONI PAOLA

E' copia conforme all'originale
ii.

21 GEN. 1998

IL SEGRETARIO
DR. FRANCO COLONNELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE



Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal:

ii.

21 GEN. 1998

IL SEGRETARIO
DR. FRANCO COLONNELLI

300
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il 31.1.98

non essendo pervenute richieste di invio a controllo,
non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.

IL SEGRETARIO

INVIO AL C.R.C.

La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo:

essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art.45, comma 1 della L.8.6.90, n.142.

ii.

IL SEGRETARIO

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per la decorrenza dei termini di cui all'art.46, comma 1, della L.142, in data

per l'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del prot.

IL SEGRETARIO



Comune di San Lorenzo Nuovo
 Provincia di Viterbo

LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
 SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

Impresa : ROMOLI Aldo di Ischia di Castro (VT)

Contratto in data 19.12.1995 Adv. n. 100/95

Comune di S. Lorenzo Nuovo
 (PROVINCIA DI VITERBO)
 P.C.C. ALL'ORIGINALE PER USO
 AMMINISTRATIVO
 SAN LORENZO IL 23.01.1998
 SEGRETARIO COMUNALE

STATO FINALE DEI LAVORI

ESERCUZI A TUTTO IL 31.12.1997

Importo del progetto approvato come da: Del.G.M.121 del 24.4.95	L. 77.000.000	Data della Consuegna	19.12.1995
Importo del contratto decorato del ribasso singole voci di elenco	L. 57.864.882	Data dell'inizio dei lavori	19.12.1995
.....	Scadenza del tempo utile per l'iniziazione dei lavori	17.12.95
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L. 15.834.820	I lavori rimasero completi in data	28.11.96
		I lavori cessarono in data	18.08.96
		II" Sospensione in data	21.10.96
		III" Ripresa in data	15.06.97
		Per cui la nuova scadenza in data	18.09.97
		Giorni impiegati in ciò
		Giorni impiegati in vece



COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO (VI)

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SOLA MATERIA ELEMENTARE E METAL

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PRELIO	IMPORTO
1	441	Vaso igienico handicappati 1	160	2.700	200 000	400 000
2	441	Fornitura e pos. di sedile antiscivolo 1	160	1.300	60 000	150 000
		Corrimano antiscivolo handicappati	uni	1.310	150 000	160 000
		Maniglia per handicappati	uni	2.700	150 000	300 000
3	441	Rubineria per handicappati 1	uni	2.110	40 000	700 000
4	442	Lavabo handicappati	uni	2.100	350 000	700 000
5	E-404	Scava a sezione rettilinea fino alla profondità di n 2,00 dal piano di sgombramento ed, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo in caso di qualsiasi natura e consistenza, sia sciolta che compatte con resistenza allo a) eseguito a mano su esplicita disposizione della D.A., senza il carico sul mezzo di trasporto	mq	74.701	70 000	5 230 470
6	E-404	Scavo a sezione rettilinea fino alla profondità di n 2,00 dal piano di sgombramento ed, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo in caso di qualsiasi natura e consistenza, sia sciolta che compatte con resistenza allo b) eseguito a mano, su esplicita disposizione della D.A., compreso il carico a mano sul mezzo di trasporto	mq	1.190	70 000	13 440
7	E-421	Demolizione totale a parete di muratura di qualsiasi tipo, forma e spessore eseguita a mano spone con l'uso di martello demolitore, su qualsiasi altezza prefissata, compresi ponti di servizio, anche con stufe, barriere, ripari,	mq	2.452	70 000	183 595
8	E-422	Demolizione di tramezzi in muratura ai tramezzi di qualsiasi specie, compresi e compresi tutti gli usi				
A riportare :						8 147 506



COMUNE DI SAN LORENZO NOCINO (VT)

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZIO	IMPORTO
		Ricordo: di cui al n. 420: ajdi tramezzi in foglio	mq.	5.050	8.000	40.400
	E-424	Arimozione di pavimenti di qualsiasi specie e di rivestimenti in maiolica e simili, compresi la demolizione della sottostante malta di allentamento e tutti gli oneri di cui ai numeri precedenti.	mq.	19.740	12.000	236.880
	E-433	Trasporto e scarico, su area da procurarsi a cura e spese dell'impresa, con qualunque mezzo a trazione meccanica di materiale di risulta da scavi e sponderio: qualunque natura e specie, anche se bagnato, e qualsiasi	mc	124.999	8.000	1.000.000
13	E-703	Muratura di piastre come all'art. 3.2. per metri di spessore oltre cm 45: a) con pietre tufo e idonee pietre tenere locali	mq	4.365	135.000	589.275
14	E-911	Muratura di mattoni pieni o forati come in foglio e volta di caice e pozzolana del n. 3.4. eseguita retta e curva ed a qualsiasi altezza e profondità, compresa l'eventuale formazione di arcitravi in c.a. e di distacchi sui vari a) con mattoni a sei fori della misura media di 190x140x280 mm	mq	3.400	17.000	57.800
15	E-101	Conglomerato cementizio non armato a prestazione garantita secondo la norma UNI9258 confezionato con cemento tipo 325 P4 in quantita' non inferiore a 200 kg/mc. diametro massimo di inerte 35 mm. con resistenza caratteristica finale: 4; a) per getti di sovrainfondi, fondazioni, platee e simili	mc	7.625	135.000	1.039.250
16	E-102	Conglomerati cementizi armati a prestazione garantita secondo la norma UNI9258, per strutture armate di fondazione (pilati, travi di collegamento, travi rovesce, solerioni per platee e simili e per le strutture in elevazione) e b) con diametro massimo degli inerti non superiore a 50				
		a ricercare :				11.625.815



COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO (VT)

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

UN.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Importo:				11.678.515
		di cui:	to	17.760	285.000	5.061.315
1	E-102	Conglomerati cementizi armati a prestazione garantita secondo la norma UNI9838, per strutture armate di fondazione (punti, travi di collegamento, travi reverse, solai) per platee e simili e per le strutture in elevazione) e c) con diametro massimo degli inerti non superiore a 25 mm	to	18.774	265.000	4.986.520
8	E-103	Sovraprezzo per conglomerato di cui all'articolo 10 per ogni aumento di 5 N/mm ² (circa 10 Kg/m ³) della resistenza caratteristica a compressione fino a raggiungere un valore massimo di 35 N/mm ² (circa 350 Kg/m ³) (classe C35)	to	21.524	1.000	215.240
9	E-104	Casseforme rette ivi compreso le armature di sostegno e di controventatura per strutture in conglomerato cementizio, di qualsiasi forma e dimensione, fino a 3,50 di altezza dal piano di appoggio delle dette armature di sostegno a) per strutture in fondazione	to	42.207	24.000	1.012.968
10	E-105	Casseforme rette ivi compreso le armature di sostegno e di controventatura per strutture in conglomerato cementizio, di qualsiasi forma e dimensione, fino a 3,50 di altezza dal piano di appoggio delle dette armature di sostegno a) per strutture in elevazione	to	73.246	24.000	1.757.904
11	E-106	Casseforme rette ivi compreso le armature di sostegno e di controventatura per strutture in conglomerato cementizio, di qualsiasi forma e dimensione, fino a 3,50 di altezza dal piano di appoggio delle dette armature di sostegno d) per armature di strutture curve	to	18.010	29.000	5.222.850
12	E-107	Armature metalliche per conglomerato cementizio con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, tagliato e misura, sagomato e posto in				
Importo:						26.378.528



COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO (VT)

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

NUM. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	Riparto: opera, comprese le legature di filo di ferro, distanziatori, sfridi, eventuali				26 378 528
	a) barre ad aderenza migliorata Fe 838 (non controllate in stabilimento	kg	1740,322	1 800	3 132 579
E-402	Manto impermeabile costituito da una membrana prefabbricata formata da elastomeri e bitumi ossidati ad sito punto di fusione con armatura di fibre di vetro e sabbia; in opera con sovrapposizione delle lamine contigue di almeno un c) dello spessore di mm 4	m ²	45,878	15 000	688 175
E-401	Intonaco pronto premiscelato a base di vermiculite e altro materiale minerale ed opportuno legante dato in opera in due riprese finite al rustico e da una successiva rasatura con finitura liscia dello spessore complessivo di circa alcun interno	m ²	44,680	17 000	759 760
E-400	Pavimento in piastrelle di ceramica pressate a secco completamente vetrificate (Gres concottate) classificabili secondo la norma UNI EN87 nel gruppo 31 con caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore), rettilineità a) piastrelle per interni e esterni con smaltate dimens. 0.10x0.20 e 0.20x0.20 m	m ²	13,540	50 000	667 000
E-343	Rivestimenti di pareti interne con piastrelle di ceramica pressate a secco (bicottura) classificabili secondo la norma UNI EN 87 nei gruppi 3111 con caratteristiche (lunghezza, larghezza e spessore) rettilineità degli spigoli. b) piastrelle delle dimensioni di 0.26x0.20 m - 0.26x0.25 m	m ²	46,000	45 000	2 070 000
E-406	Doppio rivestimento in tubo di ferro verniciato di sezione circolare Ø 40 mm a lassi posti a distanza di mm 150 uno dall'altro e di mm 50 dalla parete, con il tubo superiore posto ad una altezza dal piano di calpestio di m 0,90 e con				
A riportare :					35 419 932



ALBO FINALE DEI LAVORI DEL 1970
 COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO (VT)

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTURE
 SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

IN.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Ripetere: 2)	kg	287,334	6.900	1.982.605
		Cassette di scarico in pvc, colore "strillato" bianca, della capacità di circa, connessa ai tubi di scollata in pvc, con raccordi di appropinquazione di regolazione e connessi a miscelatore tipo Galis, con parti in vista verniciate	mq	2,300	200.000	460.000
E-VI.1		Tinteggiatura di pareti e soffitti interni con una passata di latte di calce, tassato e uccore dato a pennelli escluso il 10% di riserva b) su nuovi intonaci	mq	99,475	8.000	795.800
E-VI.1		Punto luce e corto di comando elettrotecnico esclusa la linea corsia generale e delle scatole di derivazione e cassetti a mantello, commutatori del tipo HGT-4 o HGTV-4 di sezione 1000/10 fase e di terra pari a 1,5 mmq, scatola centralina a) Punto luce condotti di derivazione dal quadro o derivato (senza luce)	mq	1,000	22.000	22.000
E-VI.1		Punto luce e corto di comando elettrotecnico esclusa la linea corsia generale e delle scatole di derivazione e cassetti a mantello, commutatori del tipo HGT-4 o HGTV-4 di sezione 1000/10 fase e di terra pari a 1,5 mmq, scatola centralina c) Punto di comando (interuttore, pulsante, oscillatore, ecc.)	mq	1,000	11.000	11.000
E-VI.3		Incremento al punto luce per opere murarie comprensive degli scassi e del ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra nella scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed a) per punto luce senza luce e intonaco	mq	1,000	9.000	9.000
E-VI.3		Incremento al punto luce per opere murarie comprensive degli scassi e del ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra nella scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed b) per punto luce con luce e intonaco	mq	1,000	9.000	9.000
A riportare :						56.565.350



COMUNE DI SAN LORENZO NUOVA (VT)

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA



Q.M.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto: resatura ed b) per punto di consumo				36.605.937
		Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPV in soffocavalina in PVC (CFL 20-13), sigla di designazione R2SR 0,6 KV posta in opera comprensiva di ogni onere per l'installazione su tubazione in vista o incassata, canaletta, passerelle a) 1 x 35 mmq	020	1.000	6.000	6.000
		Tubazione flessibile in PVC autoprotettiva serie leggera LMG da incassare sotto traccia escluse le opere murarie, di scasso e di ripristino della pavimentazione, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento b) diametro esterno 20 mm	01	10.000	7.000	70.000
		Riflettore a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro con lampada di lampara incandescente con attacco E27, eventuale gobbia di protezione, il tutto con grado di protezione IP55, posta in opera funzionante e b) con lampada max 200w	020	1.000	50.000	50.000
		Scavo a sezione aperta per sbrancamento e spiatamento, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico in roccia di qualsiasi natura e consistenza, sia sciolte che compatte con resistenza allo schiacciamento fino a 4 N/mm ² (circa 40)	01	153.469	3.900	598.529
		Fornitura e posa in opera di cigli prefabbricati, sia retti che conformati, in conglomerato di cemento vibrocompreso costituito con quantità di cemento tipo R425 non inferiore a quelli 3,20 a mc e granelli in proporzione opportuna.	01	12.200	35.000	427.000
		Pavimentazione in cubetti di corallo, posti in opera diritti o ad arco, allietati in sabbia e cemento e susseguente pulizia della superficie, su sottostante massetto di fondazione in conglomerato				
A riportare :						37.534.466



COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO (VT)

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCUOLA MATERIA ELEMENTARE E MEDIA

HUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.P.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
						37.534.488
		Risarcito: a) canalicolo da pagarsi a b) laici delle dimensioni da cm 60 a cm 80	mq	9,750	64.300	624.640
		Rivestimento di scarico regolare senza di riacuglio di specie erbacea, compresa la lavorazione del terreno, concimazione, eventuale riprese della superficie, fornitura e spandimento del seme, nella giusta quantità, le	mq	380,078	1.200	396.094
41	4927	Recinzione a parete alta di m 2 costituita con rete metallica dell'altezza di m 1,85 del tipo standard elettrosaldata a maglia quadrata di tipo 80x50mm. realizzata in filo zincato nel diametro di mm 2,5. paletti verticali intermedii	mq	34,800	49.300	1.598.000
42	4928	Realizzazione del piano di posa della pavimentazione stradale con materiali aridi, compresa la fornitura, lo spandimento ed idoneo accostamento, assicurato su autonomia in arrivo o in uscita a via d'opera: a) con sovrapposizione vista e guida con lastre di cemento	mq	10,500	22.300	234.150
43	4929	Fornitura e posa in opera di tubi di cemento vibrocompattato per fogna e fognoli di acqua bianca, con giunti a battente stuccati con resina cementizia a kg 400 di cemento tipo 3 125 per mc di sacco, escluso il trasporto ed i rifilamenti: b) del diametro interno di cm 300	ml	2.000	59.300	298.600
44	4930	Intonaco grezzo frantumato e arrenditura costituito da un primo strato di intonaco e da un secondo strato frantumato rustico, applicato su pareti verticali, esclusa la formazione di porte e guide ed i collegi, compreso ogni	mq	34,480	32.300	111.360
45	4931	Aliscocle per apparecchio igienico sanitario, fornite e posate in opera all'interno nei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di interconnessione ubimate nei locali, comprendente: a) valvole svedesche, le b) vaso a cacciata	cat	4,500	125.000	492.000
						41.514.584
		si riportare :				



ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riparto:				41.614.584
		Allaccio per apparecchio igienico sanitario, fornito e posto in opera all'interno del bagno, wc, doccia e cucine scu. e valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, la	mq	2,000	175.000	350.000
47	MF06	Allaccio per apparecchio igienico sanitario, fornito e posto in opera all'interno del bagno, wc, doccia e cucine scu. e valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, la	mq	2,000	270.000	540.000
48	MF07	Sussola in tutto come al n.174 da in legno di rovere esalica a moqare.	mq	4,193	270.000	1.132.570
49	MF08	Fornitura e posa in opera di canale di gronda in rame sviluppo 28 m compreso ogni onera e registro	ml	18,550	40.000	742.000
50	MF09	Fornitura e posa in opera di pilastrina in rame ø 80 compreso ogni onera e registro	ml	7,500	55.000	412.500
51	MF10	Esecuzione di fori per ancoraggio ferri pendolina a muratura esistente, iniezione di resine compreso ogni onera e registro	corso	1,000	2.000.000	2.000.000
52	MF11	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla Direzione dei lavori, di materiale di qualsiasi genere e provenienza compreso l'eventuale carico sui mezzi di trasporto:	mq	70,530	34.000	2.417.820
		a) fino alla distanza di m 40				
53	MF12	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per formazione di aiuole o simili, non proveniente da scavi di cantiere, esente da radici e materie rocciose in genere	mq	42,011	45.000	1.890.495
54	MF13	Fondazione stradale sia per lavori all'aperto che in galleria, compresa la fornitura dei materiali, prove				
		A riportare:				51.059.469



CIVICHE DI SAN LORENZO NUOVO (VT)

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	C.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	Ricorso: a) laboratorio, lavorazione e posaspimento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della curva AAS=0 b) in asfalto granulare stabilizzato con legante naturale	cc	14.100	17.000	239.700
4314	Massicciata stradale costituita da pietrisco calcareo con pezzatura 40-70 mm compresa la fornitura del pietrisco la stesa, la cilindatura con rulli da 12 a 18 T, compresi altresì gli eventuali ricarichi durante la cilindatura, c) per una spessore finito di cm 100	cc	101.700	5.200	528.840
SOMMARIO LAVORI					768.540
Anticipazione				cc	755.400
Ingresso Certificato di Pagamento No. 1 in data 03/12/1996 per l'importo di Lire					-26.000.000
Ingresso Certificato di Pagamento No. 2 in data 15/01/1997 per l'importo di Lire					-17.000.000
A DETRAERE GLI ACCONTI CORRISPONDI					-48.000.000
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN L.					2.301.974

Il Direttore dei Lavori



ROCCHI Geom. ALDO
IMPRESA EDILE ACQUEDOTTI E FOGNATURE
Sede Legale: Via Caduti sul Lavoro, 6
Tel. 0731 - 426111/07310153411 CASTRO (VT)
P. IVA 0333/060560
